PLANNING CENTRUM PLAN LIEMPDE SPPILL

OVERALLPLANNING

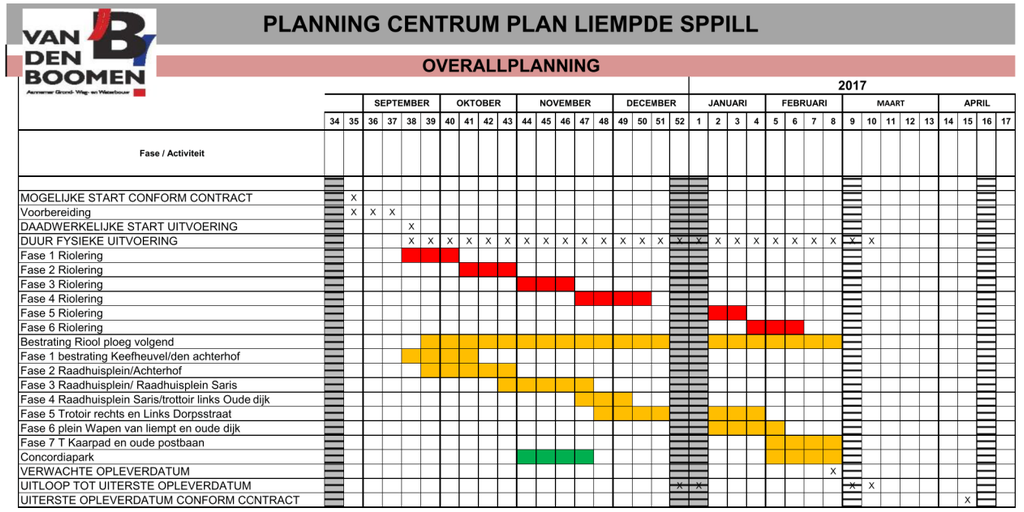

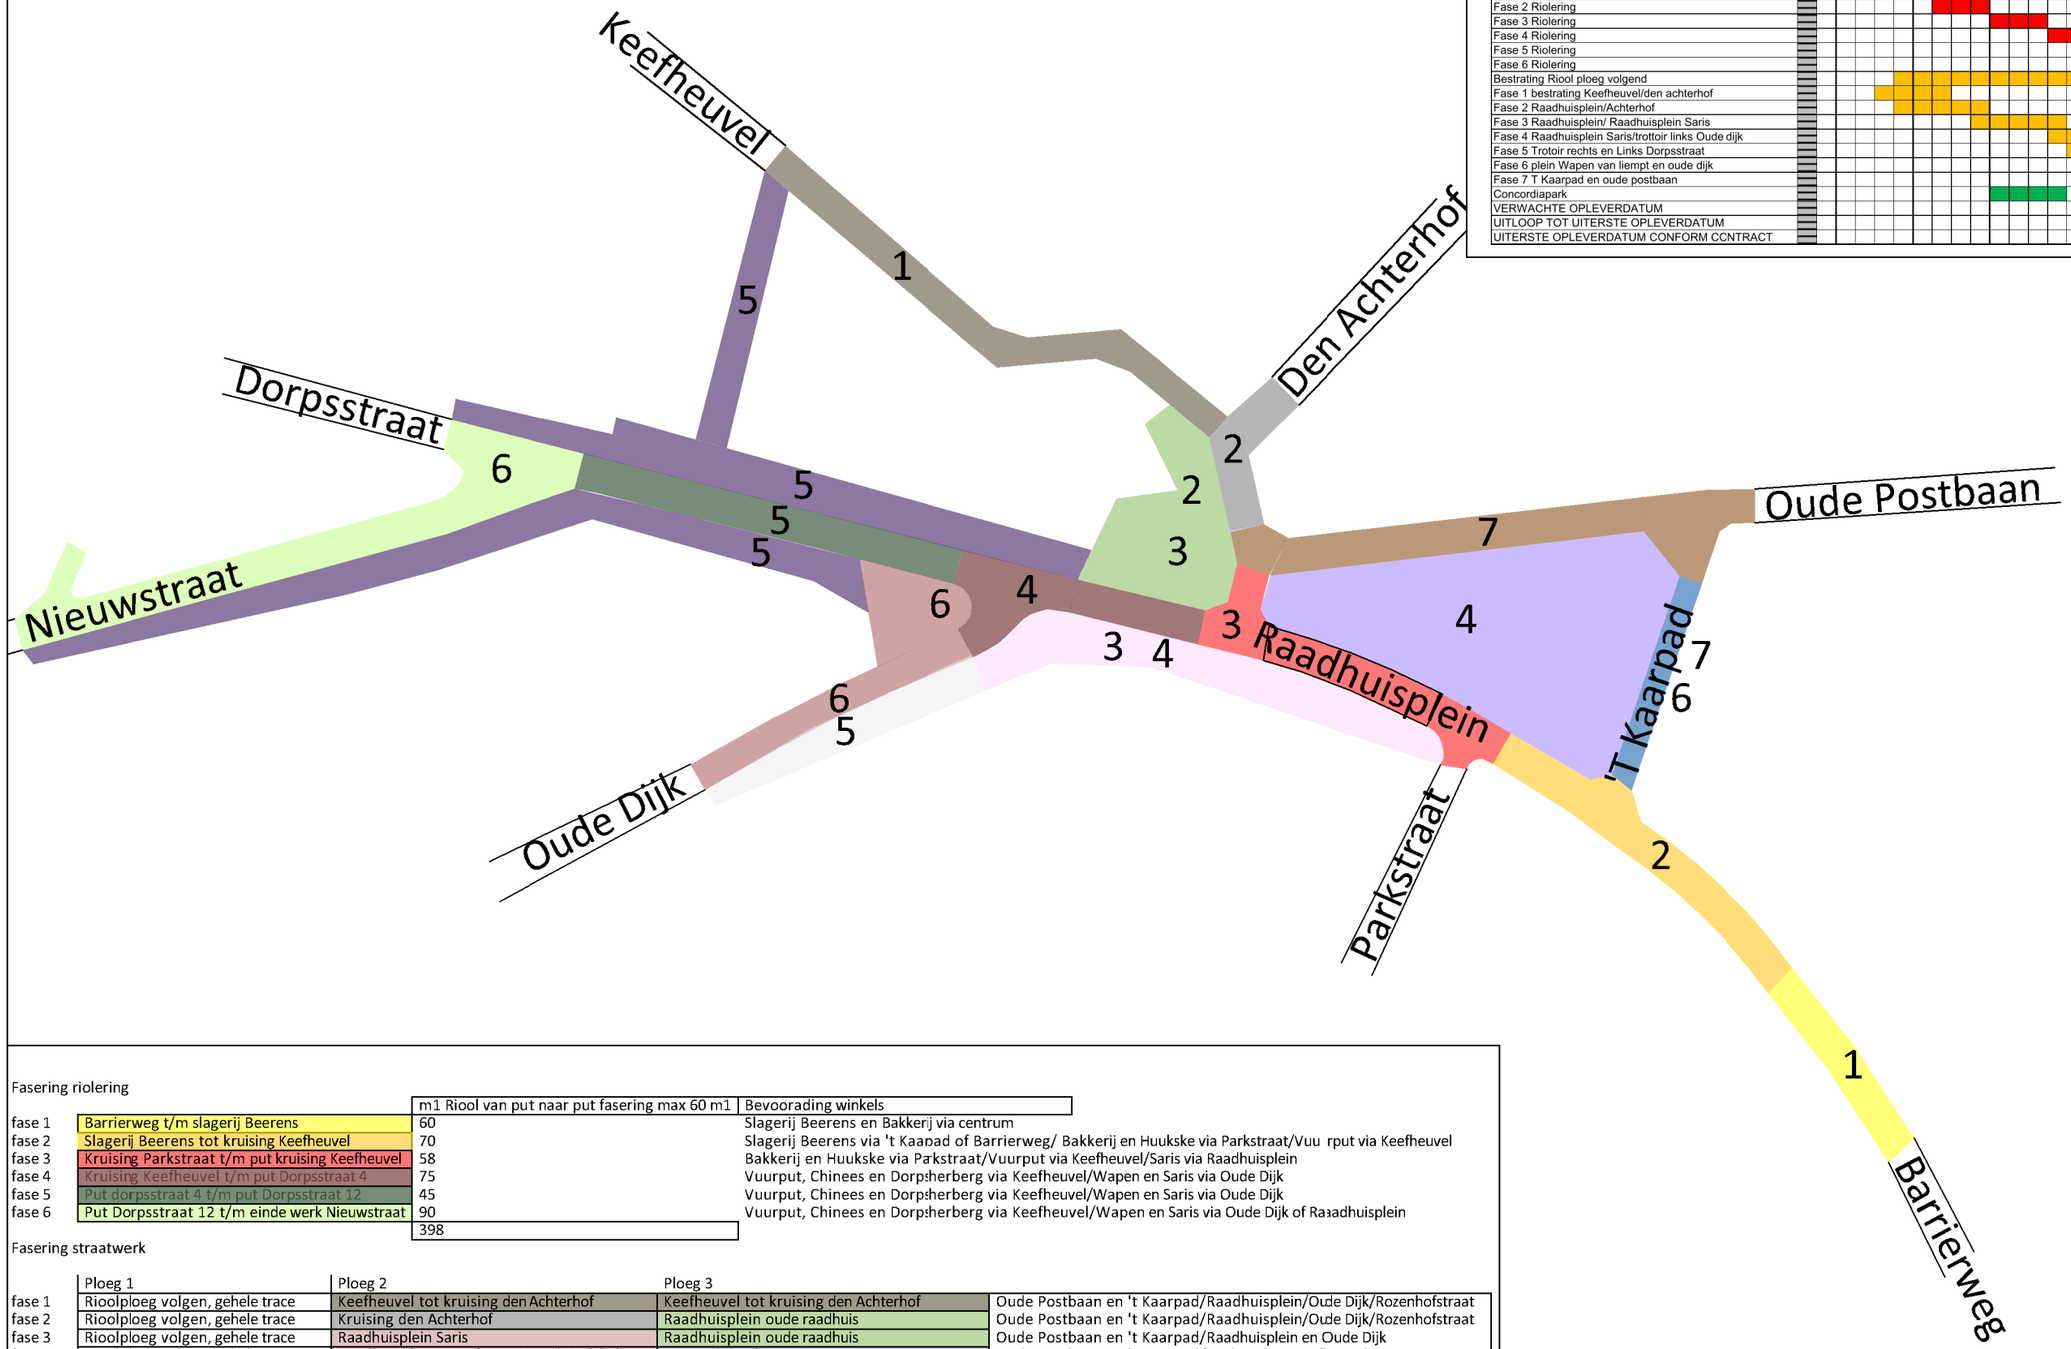

Fasering riolering

		m1 Riool van put naar put fasering max 60 m1	Bevoorading winkels
fase 1	Barrierweg t/m slagerij Beerens	60	Slagerij Beerens en Bakkerij via centrum
fase 2	Slagerij Beerens tot kruising Keefheuvel	70	Slagerij Beerens via 't Kaapad of Barrierweg/ Bakkerij en Huukske via Parkstraat/Vuu rput via Keefheuvel
fase 3	Kruising Parkstraat t/m put kruising Keefheuvel	58	Bakkerij en Huukske via Parkstraat/Vuurput via Keefheuvel/Saris via Raadhuisplein
fase 4	Kruising Keefheuvel t/m put Dorpsstraat 4	75	Vuurput, Chinees en Dorpsherberg via Keefheuvel/Wapen en Saris via Oude Dijk
fase 5	Put dorpsstraat 4 t/m put Dorpsstraat 12	45	Vuurput, Chinees en Dorpsherberg via Keefheuvel/Wapen en Saris via Oude Dijk
fase 6	Put Dorpsstraat 12 t/m einde werk Nieuwstraat	90	Vuurput, Chinees en Dorpsherberg via Keefheuvel/Wapen en Saris via Oude Dijk of Raaadhuisplein
		398	

Fasering straatwerk

	Ploeg 1	Ploeg 2	Ploeg 3	
fase 1	Rioolploeg volgen, gehele trace	Keefheuvel tot kruising den Achterhof	Keefheuvel tot kruising den Achterhof	Oude Postbaan en 't Kaarpad/Raadhuisplein/Oude Dijk/Rozenhofstraat
fase 2	Rioolploeg volgen, gehele trace	Kruising den Achterhof	Raadhuisplein oude raadhuis	Oude Postbaan en 't Kaarpad/Raadhuisplein/Oude Dijk/Rozenhofstraat
fase 3	Rioolploeg volgen, gehele trace	Raadhuisplein Saris	Raadhuisplein oude raadhuis	Oude Postbaan en 't Kaarpad/Raadhuisplein en Oude Dijk
fase 4	Rioolploeg volgen, gehele trace	Raadhuisplein Saris/Trottoir Oude Dijk links	Concordiapark	Oude Postbaan en 't Kaarpad/Oude Dijk en Keefheuvel
fase 5	Rioolploeg volgen, gehele trace	Trottoir Oude Dijk links	Bestrating trottoir Dorpsstraat rechts en links	Oude Postbaan en 't Kaarpad/Raadhuisplein en Keefheuvel/Barrierweg
fase 6	Rioolploeg volgen, gehele trace	't Kaarpad	Plein 't wapen en Oude Dijk	Oude Postbaan/Dorpsstraat/Keefheuvel/Oude Dijk/Barrierweg
fase 7	Rioolploeg volgen, gehele trace	Oude Postbaan	't Kaarpad	Dorpsstraat/Keefheuvel/Barrierweg/Raadhuisplein
fase 8	Rioolploeg volgen, gehele trace	Opleverpunten afwerken	Opleverpunten afwerken	Overal in parkeer gelegenheden

VAN DEN BOOMEN
Aannemer Grond-Weg-en Waterbouw
www.vd-boomen.nl
